

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

číslo Zhotoviteľa: ZoD 149/2020-CS

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry
Štatutárny orgán:	Ing. Juraj Kulík
IČO:	46119809
DIČ:	2023231496
IČ DPH:	SK2023231496, podľa §4
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK87 0200 0000 0028 6898 7654

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných:
- b) technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 7 ,917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	predstavenstvo spoločnosti: Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
Zapísaná v:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 240/V
IČO:	31651402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ závodu Divízia Východ
b) technických:	Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad
Číslo telefónu:	+421 55 633 0088
Email:	colas@colas-sk.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia“ (Rekonštrukcia Protipožiarnej lesnej cesty - Odvozná lesná cesta trieda 1L, 4,0/30, K.Ú. Tatranská Lomnica). Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu **Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska (Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainable forests in cross-border region of Ukraine and Slovakia)** (ďalej len „Projekt“) v rámci operačného programu ENI HUSKROUA CBC.
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy „Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu..

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „Cesty k zdravým lesom: odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“ (Rekonštrukcia Protipožiarnej lesnej cesty - Odvozná lesná cesta trieda 1L, 4,0/30, K.Ú. Tatranská Lomnica). Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa oceneného výkazu výmer – Príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – Príloha č. 2;
 - podľa časového plánu výstavby diela (harmonogramu) – Príloha č. 3;
 - podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

**Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, a ďalších.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom miesta, ktorého sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie a realizáciu kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	254 394,69- eur
DPH 20%	50 878,94- eur
Spolu	305 273,63- eur

Slovom	Dvestopäťdesiatštyritisictristodeväťdesiatštyri 69/100 - eur bez DPH
Slovom	Tristopäťtisícdeväťdesiatštyri 63/100 - eur s DPH

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Neplatiteľ DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplní.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy **na základe písomného vyzvania dodávateľa Objednávateľom:**
 1. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH), alebo
 2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú záruku (5 % z Ceny za Dielo bez DPH) a garančnú zábezpeku (5 % z Ceny za

Dielo bez DPH). Nezloženie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, alebo

3. v prípade využitia inštitútu bankovej záruky verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa predložiť Výkonovú bankovú záruku vo výške 10% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná od podpisu Zmluvy o dielo do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, a následne bude Verejný obstarávateľ požadovať pri prevzatí diela predložiť Garančnú bankovú záruku vo výške 5% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná odo dňa prevzatia diela Objednávateľom do skončenia záručnej doby. Zloženie Garančnej bankovej záruky pri prevzatí diela je podmienkou pre vrátenie Výkonovej bankovej záruky.

- 5.3. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4. V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.
- 5.6. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.7. Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Cena za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.8. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo neho, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príťahových používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.9. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

- 5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prilohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.12. Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.13. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - g) ITMS/IMIS kód projektu, názov projektu,
 - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy.
- 5.14. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškani s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.8 tohto článku Zmluvy.
- 5.15. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 35 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým plánom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, odkedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia

Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diela a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Odvozná lesná cesta trieda 1L, 4,0/30, K.Ú. Tatranská Lomnica, okres: Kežmarok (viď Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia).

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺni svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Oznámenie o zmene subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť

subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu s oznámením o zmene subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR

SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- j) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- o) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu bez väd a nedorobkov Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Štafana Zimu
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Peter Jurčo, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 11938.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela podľa časového harmonogramu. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzдание a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzдание všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzдание a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytípané prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzдание Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

- 10.8. Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Dokumentácia potrebná ku kolaudačnému konaniu, prevádzke diela a k uplatňovaniu záruk.

**Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do 10 pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Papala – riaditeľ závodu Divízie Východ
Tel: +421 910 803 939
Email: martin.papala@colas-sk.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad
Tel: +421 904 703 437
Email: peter.jurco@colas-sk.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Juraj Kulík, konateľ
Tel: +421 903 630 689
Email: lesykk@hotmail.com
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Štefan Zima, spoluautor projektu
Tel: +421 905 407 941, +421 905 903 019
Email: ste.zima@gmail.com

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k

Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a EU v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - neposkytnutie výkonovej/garančnej záruky podľa bodu 5.2;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - porušenie bodu 8.2. c) a d) Zmluvy,
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom

porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.
- 16.2 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela
 - Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
 - Príloha č. 5 – Poistná zmluva
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")

bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s ustanovením podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa

- 16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V *Košiciach*, dňa *06.07.2021*

V Košiciach, dňa 06.07.2021



Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.



Príloha číslo 1 – Očenený výkaz výmer

Príloha číslo 2 – Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 – Časový plán výstavby diela

Príloha číslo 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha číslo 5 – Poistná zmluva

ZADANIE

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Objekt: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Miesto: Kežmarské Žľaby

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 240979,69

1 Zemné práce 10825,63

1 R	111103202		Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého	ha	0,924	900,00	831,60
2 R	111201102		Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	6150,000	0,40	2460,00
3 R	111201401		Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	6150,000	0,20	1230,00
4 R	122302201		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	81,250	7,30	593,13
5 R	124303101		Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	365,000	4,88	1781,20
6 R	124303109		Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	365,000	0,01	3,65
7 R	124303119		Priplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	m3	356,000	0,01	3,56
8 R	130901122		Búranie konštrukcii z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	5,349	111,85	598,29
9 R	132311121		Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	88,000	35,15	3093,20
10 R	185803101		Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hladiny divokého porastu	ha	0,924	250,00	231,00

4 Vodorovné konštrukcie 11359,08

11 R	465921111		Oprava dlažieb z bet. dosiek na sucho, s prípadnou výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich, do hmotnosti dosiek do 90 kg, hr.dosiek do 100 mm	m2	810,000	11,12	9007,20
12 592	592270000100		Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	834,000	2,82	2351,88

5 Komunikácie 198016,55

13 R	564732111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	320,000	2,88	921,60
14 R	564752111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	50,000	4,32	216,00

ZADANIE

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Objekt: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Miesto: Kežmarské Žľaby

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15 R		564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	415,000	7,19	2983,85
16 R		569231111	rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm, vrátane dodávky kameniva	m2	4620,000	2,93	13536,60
17 R		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	30865,000	0,22	6790,30
18 R		576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	15665,000	5,95	93206,75
19 R		577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15665,000	5,13	80361,45

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20721,52

20 R		919441211	Čelo priepustu z muríva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500	ks	5,000	418,49	2092,45
21 R		919441221	Čelo priepustu z muríva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800	ks	2,000	874,82	1749,64
22 R		919442211	Hospodársky prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet.do DN 500 mm, čelá z kam.muríva,prevýšenie do 600 mm	ks	4,000	675,80	2703,20
23 R		919443111	Vtoková nádržka z muríva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	1 044,10	1044,10
24 R		919492911	Priplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry betónové, čelá z kam.muríva	ks	16,000	123,66	1978,56
25 R		919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	7,000	58,75	411,25
26	592	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TYP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	7,070	164,84	1165,42
27 R		938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	15200,000	0,09	1368,00
28 R		938909405	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nános nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	540,000	2,97	1603,80
29 R		938909422	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nános nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	7390,000	0,58	4286,20
30 R		938909611	Odstránenie nános na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	4620,000	0,47	2171,40
31 R		979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	41,086	1,87	76,83

ZADANIE

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Objekt: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Miesto: Kežmarské Žľaby

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32 R		979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	698,462	0,10	69,85
33 R		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	41,086	0,01	0,41
34 R		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,086	0,01	0,41

99 Presun hmôt HSV 56,91

35 R		998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5690,646	0,01	56,91
------	--	-----------	--	---	----------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13415,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7429,00

36 R		767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	28,000	28,00	784,00
37 553		553560008500	Zábradlie, rúrka vodórovná pre zábradlie SC600-5, ocelová konštrukcia, dĺžky 2500 mm	ks	11,200	210,00	2352,00
38 R		767891902	Opravy ostatných doplnkov stavieb výmena rúrok zábradlia ocelových privarených, - 0,00100t	m	30,000	25,00	750,00
39 141		141110005200	Rúra ocelová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	30,000	38,00	1140,00
40 R		767891902-1	Opravy ostatných doplnkov stavieb výmena stojok, -0,00100t	m	20,000	25,00	500,00
41 133		133830000200	Tyč ocelová prierezu IPE	t	0,203	1 000,00	203,00
42 R		767914810	Demontáž zábradlia na ocelové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	30,000	15,00	450,00
43 R		767991911	Ostatné opravy samostatným zvarovaním a nahrievaním prvkov	m	50,000	25,00	1250,00
44 R		998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,325	0,01	0,00

783 Nátery 5986,00

45 R		783401812	Odstránenie korózie z kovových zábradlí oškrabaním a ocelovou kefou DN 50 do DN 100	m	190,200	20,00	3804,00
46 R		783425150	Nátery kov. zábradlia do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 70µm	m	218,200	10,00	2182,00

**Celkom bez DPH
20% DPH**

**254 394,69
50 878,94**

ZADANIE

Stavba: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Objekt: Protipožiarna lesná cesta Trasa

Miesto: Kežmarské Žľaby


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Celkom s DPH							305 273,63

2

TÁTO PD BOLA OVERENÁ AKO

S. ÚPRAVA J. Č. *1989/2008*

DŇA *22. 5. 2008*



LESNÉ PROJEKTY

Ing. František Háber, asing.

Boľbarská 1
040 01 KEŽMAROK

Tel : 055/ 6770294

Mob: 0903 603 855

E-mail: lesneprojekty@stonline.sk

Vedúci projektant
Ing. František Háber

Zodpovedný projektant
Ing. František Háber

Upracoval
Ing. Tomáš Háber

Okres	Kežmarok	Obec	Tatranská Lomnica	Číslo zákazky	02/2007
Investor	MESTO KEŽMAROK			Dátum	február 2007
Stavba	Protipožiarna lesná cesta TRASÁ – rekonštrukcia			Stupeň	J P D
Objekt	Lesná cesta odvozná			Format	A4
Obsah	2. Technická správa			Mierka	1:15 000, 1:50 1:25 000

Ing. František Háber, asing.
Vedúci projekcie

Bulharská 1
040 01 KOŠICE

Telefón : 095/ 6770294

Mobil : 0903 603 855

E-mail : lesneprojekty@stonline.sk

2. Technická správa

A. Súčasný stav

Táto odvozná lesná cesta 1L 4,0/30, ktorá je navrhovaná na rekonštrukciu je už v dezolátnom stave :

- *na ploche pôvodne penetrovanej vozovke už prakticky chýba kryt*
- *na vozovke je množstvo výtlkov až erozívnych rýh,*
- *zanesené priekopy,*
- *rozpadajúce sa čelá priepustov,*
- *nánosmi vyvýšené bankety,*
- *miestami chýba odvodnenie telesa cesty - pozdĺžne i priečne,*
- *chýbajú spevnené výhybne a výjazdy.*

Tieto nepriaznivé pomery zjazdnosti cesty sťažujú prístup techniky aj pracovníkov k plneniu mimoriadne vysokých hospodárskych úloh pri celkovej revitalizácii gravitujúcich lesných porastov sprístupnených touto cestou.

B. Celkový popis a zdôvodnenie rekonštrukcie a jej umiestnenia

Celá rekonštruovaná trasa sleduje pôvodnú trasu pôvodne penetrovanej ktorej lesnej cesty kategórie 1L 4,0/30.

Je navrhovaná spevnená odvozná cesta asfaltovým kobercom, čo sa týka smerových a výškových pomerov a spevnenia plne zodpovedajúca parametrom lesnej cesty kategórie 1L 4,0/30 :

šírka koruny : 4,0 m

šírka spevnenia (vozovky) : 3,0 m

šírka krajníc : 2 x 0,50 m

Vozovka sa navrhuje spevniť asfaltovým kobercom hr. 5 cm z dôvodu jej odolnosti hlavne proti vode a mrazom v týchto vysokohorských podmienkach čo najlacnejším technologicky možným spôsobom .

Pre zlepšenie pozdĺžneho odvodnenia a zamedzeniu tečeniu vody po vozovke sa navrhuje vyčistenie jestvujúcej zanesenej priekopy.

Priečne odvodnenie je riešené tiež tým najnutnejším spôsobom: Navrhuje sa vyčistiť všetky jestvujúce priepusty, ich vtoky a výtoky, oprava čiel týchto priepustov a výstaba nových priepustov na najzamokrenejších miestach, kde je v dôsledku vodnej erózie aj vozovka najviac rozrušená.

Od rekonštrukcie tejto odvoznej lesnej cesty sa očakávajú tieto efekty :

- včasné výchovné zásahy v prebierkových porobitoch a sieťam rýchleho výrubu utláčaných uschynajúcich stromov - to výrazne zníži riziko zvyšovania nebezpečie kôrovcavej kalamity - spoločne s ostatnými opatreniami v požiariach*

;. Údaje o projektovaných kapacitách

<i>Celková dĺžka trasy cesty</i>	<i>4 480 m</i>
<i>Navrhuje sa rekonštruovať</i>	
<i>lesná odvozná cesta s krytom z PHM</i>	
<i>Kategória</i>	<i>1L 4,0/30</i>
<i>šírka koruny</i>	<i>4,0 m</i>
<i>šírka vozovky</i>	<i>3,0 m</i>
<i>podklad vozovky – vyspravenie výtlkov kamenivom</i>	
<i>drveným obalovaným asfaltom priemernej hrúbky</i>	<i>hr. 4 cm</i>
<i>kryt vozovky – asfaltový koberec</i>	<i>hr. 5 cm</i>

D. Navrhované stavebné práce a ich postup

Celá rekonštruovaná trasa sleduje pôvodnú trasu ktorej výškové a smerové pomery plne zodpovedajú kategórie cesty 1L 4,0/30.

Postup stavebných prác :

- 1/ odstránenie pňov a krovia z okrajových častí telesa cesty, hlavne zo strany priekopy v minimálnom množstve,*
- 2/ čistenie vozovky,*
- 3/ odstránenie nánosov z krajníc,*
- 4/ čistenie priekop,*
- 5/zhotovenie a čistenie priepustov, vtokov a výtokov,*

- sprístupnenie komplexu lesov na exponovaných horských stanovištiach, ktoré sú poškodené pôsobením viacerých škodlivých činiteľov, hlavne imisii
- a následným napadnutím podkôrnym hmyzom a tým aj veternými kalamitami,
- plnenie vysokých hospodárskych úloh hlavne v pestovnej činnosti a v celkovom ozdravovaní, obnove a ochrany lesa (predovšetkým podkôrnym hmyz) vo všetkých porastoch sprístupnených touto zrekonštruovanou cestou,
- ochrana lesných kultúr a mladých lesných porastov proti požiarom,
- včasné výchovné zásahy v prebierkových porastoch s cieľom rýchleho výrubu utláčaných uschýnajúcich stromov, ktorých hromadenie by zvyšovalo nebezpečie kôrovцovej kalamity, následnej veternej kalamity a požiarov,
- zefektívnenie dopravy pracovníkov, prostriedkov, materiálu a sadeníc,
- zlepšenie riadenia výroby vo vzťahu k rozsiahlym pestovným úlohám a ozdravným opatreniam,
- zlepšenie podmienok pre monitorovanie a ochranu proti podkôrnemu hmyzu,
- skrátenie dopravných vzdialeností pre všetky činnosti,
- celoročné sprístupnenie neprístupných porastov,
- úspora nákladov na pestovnú činnosť,
- podstatné skvalitnenie pestovnej činnosti,
- úsporu PHM vo všetkých činnostiach,
- zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov,
- zväčšenie bezpečnosti práce, zjednotenie podmienok práce, zabezpečenie údržby a
- zjednotenie podmienok práce, zjednotenie podmienok práce, zabezpečenie údržby a

- 6/ zhotovenie a oprava čiei a vtokových šachiet priepustov,
- 7/ spevnenie výjazdov a výhybní štrkodrvinou,
- 8/ vyspravenie podkladu obaľovanou drvinou o priemernej hrúbke 4 cm po celej dĺžke a šírke vozovky,
- 9/ zhotovenie asfaltového koberca hr. 5 cm na ceste včítane výhybní a výjazdov,
- 10/ zhotovenie zemných krajníc.

Podrobné údaje k vykonaniu stavebných prác a ich množstvá sú zrejme z výkresov a z výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto dokumentácie.



V Košiciach, február 2007

Vypracoval




2

TÁTO PD BOLA OVERENÁ AKO

ST-OPRÁVA J. E. *1985/2006*

DŇA *27.5.2008*

v. o.



LESNÉ PROJEKTY

Ing. František Háber, asing.

vedúci projektant

Bulharská 1

040 01 KOŠICE

Tel : 055/ 6770294

Mob: 0903 603 855

E-mail: lesneprojekty@stonline.sk

Vedúci projektant	Ing. František Háber
Zodpovedný projektant	Ing. František Háber
Výpracoval	Ing. Tomáš Háber

Okres	Kežmarok	Obec	Tatranská Lomnica	Číslo zákazky	02/2007
Investor	MESTO KEŽMAROK			Datum	február 2007
Stavba	Protipožiarna lesná cesta TRASA – rekonštrukcia			Stupeň	JPD
Objekt	Lesná cesta odvozná			Format	A4
Obsah	3. Celková situácia rekonštrukcie a výkresy			Mierka	1:15 000, 1:50 1:25 000


VZOROVÝ PRIEČNY REZ

M = 1 : 50

LEGENDA

-  VOZOVKA (ASF. KOBEREC)
-  KRAJNICE
-  KAMENIVO OBAL. ASFALTOM
-  ČISTENIE PRIEKOP
-  ČISTENIE KRAJNÍC


STANIČENIE

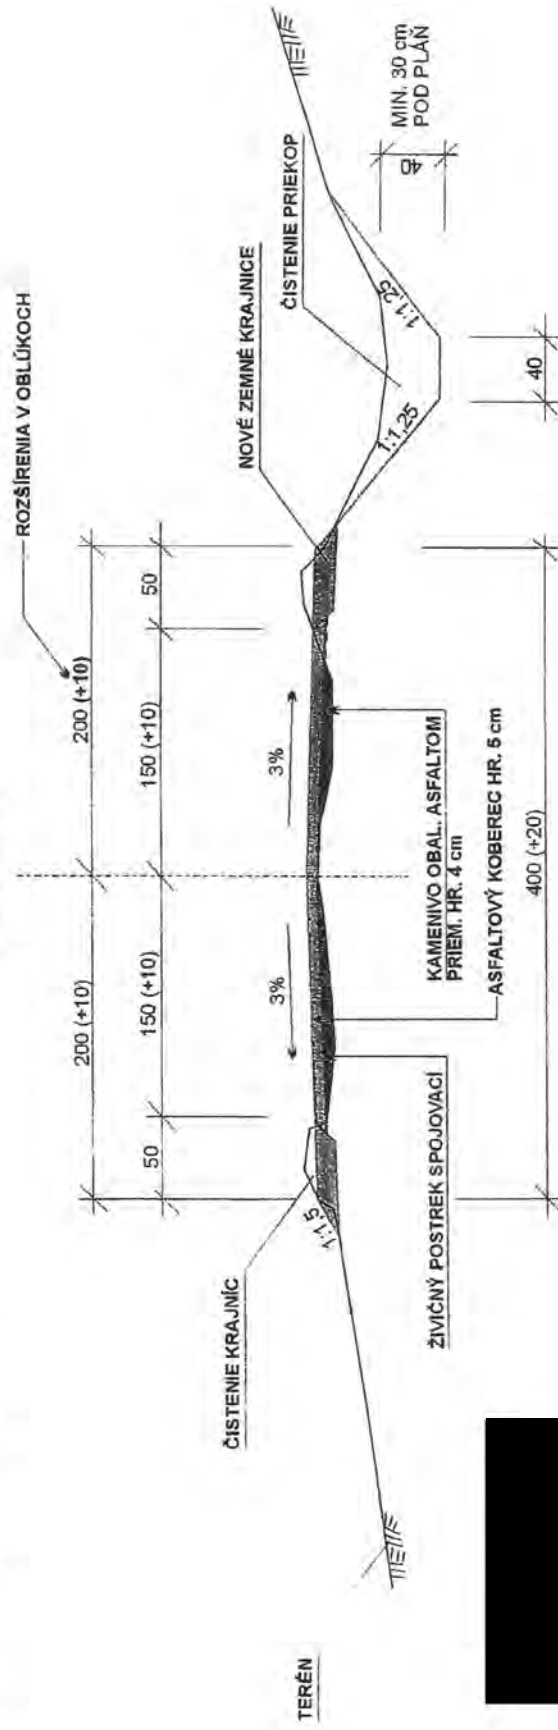


TATO PD BOLA OVEŘENÁ AKO
 STUPNĚNÁ ... J. Č. 15.09.2008
 ... 22. 11. 2008
 62-02

CESTNÉ PRIEPUSTY Z RÚR TZP D = 60 cm

M = 1 : 50

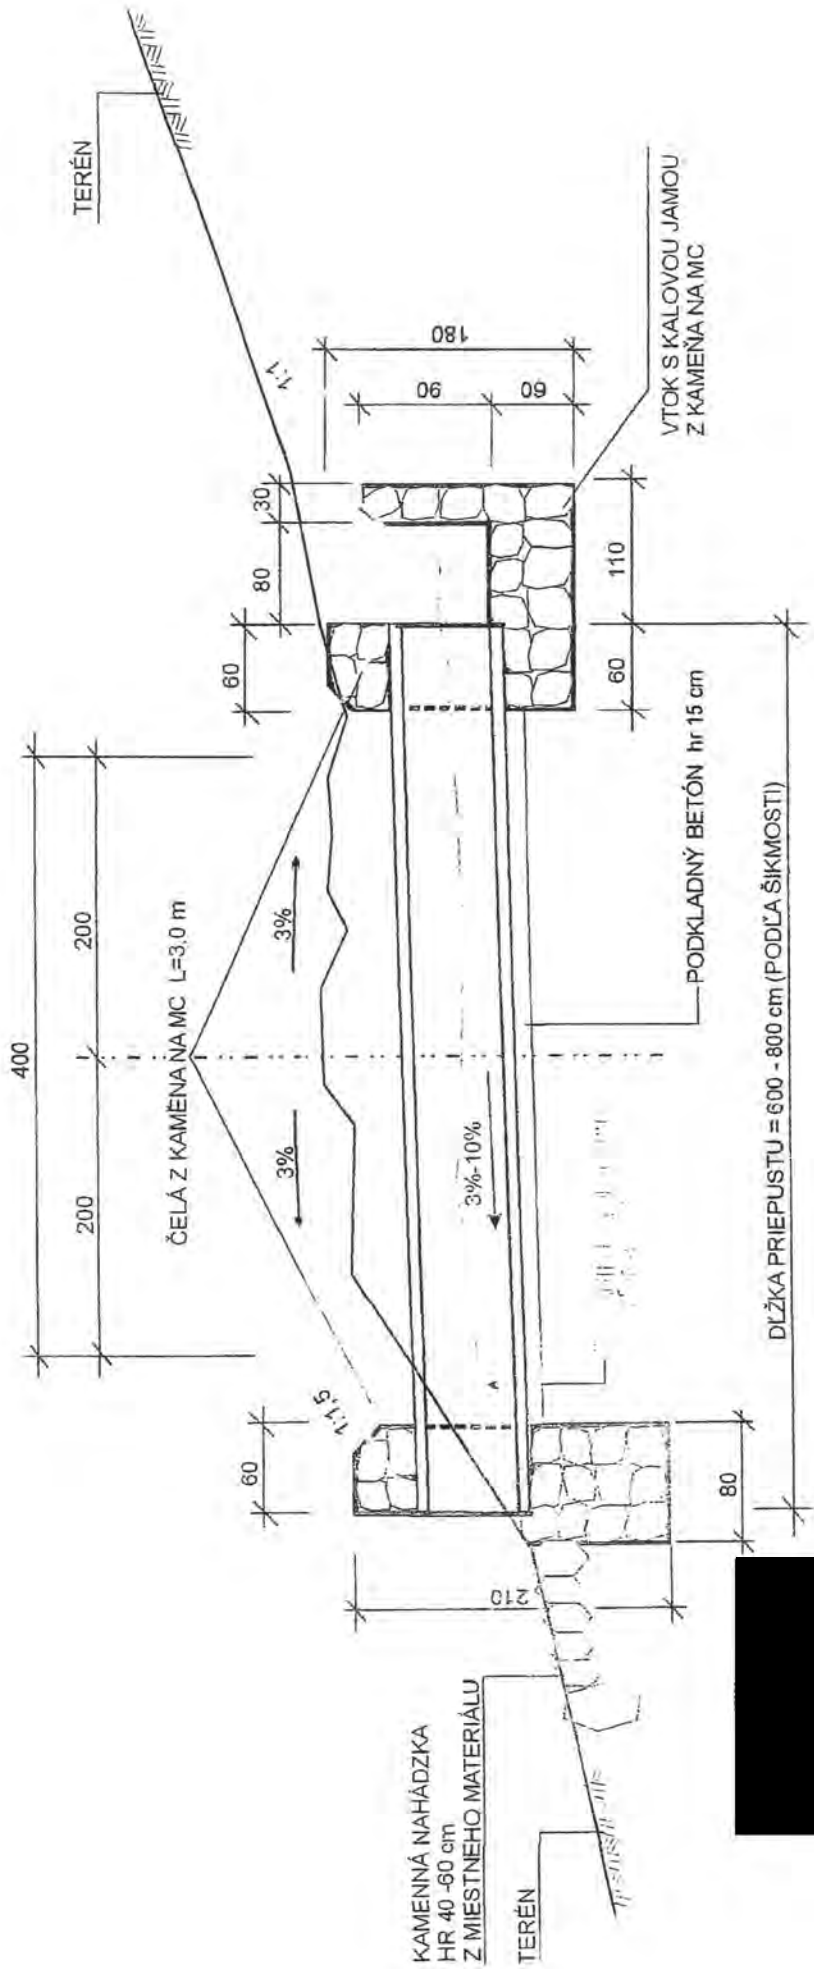


100% BOLA OVERENÁ AKO
ST. VEČERKA d.č. 1489/2003
 z.č. 22.5.2008




HOSPODARSKE PRIEPUSTY Z RÚR TZP D = 40 cm

M = 1 : 50

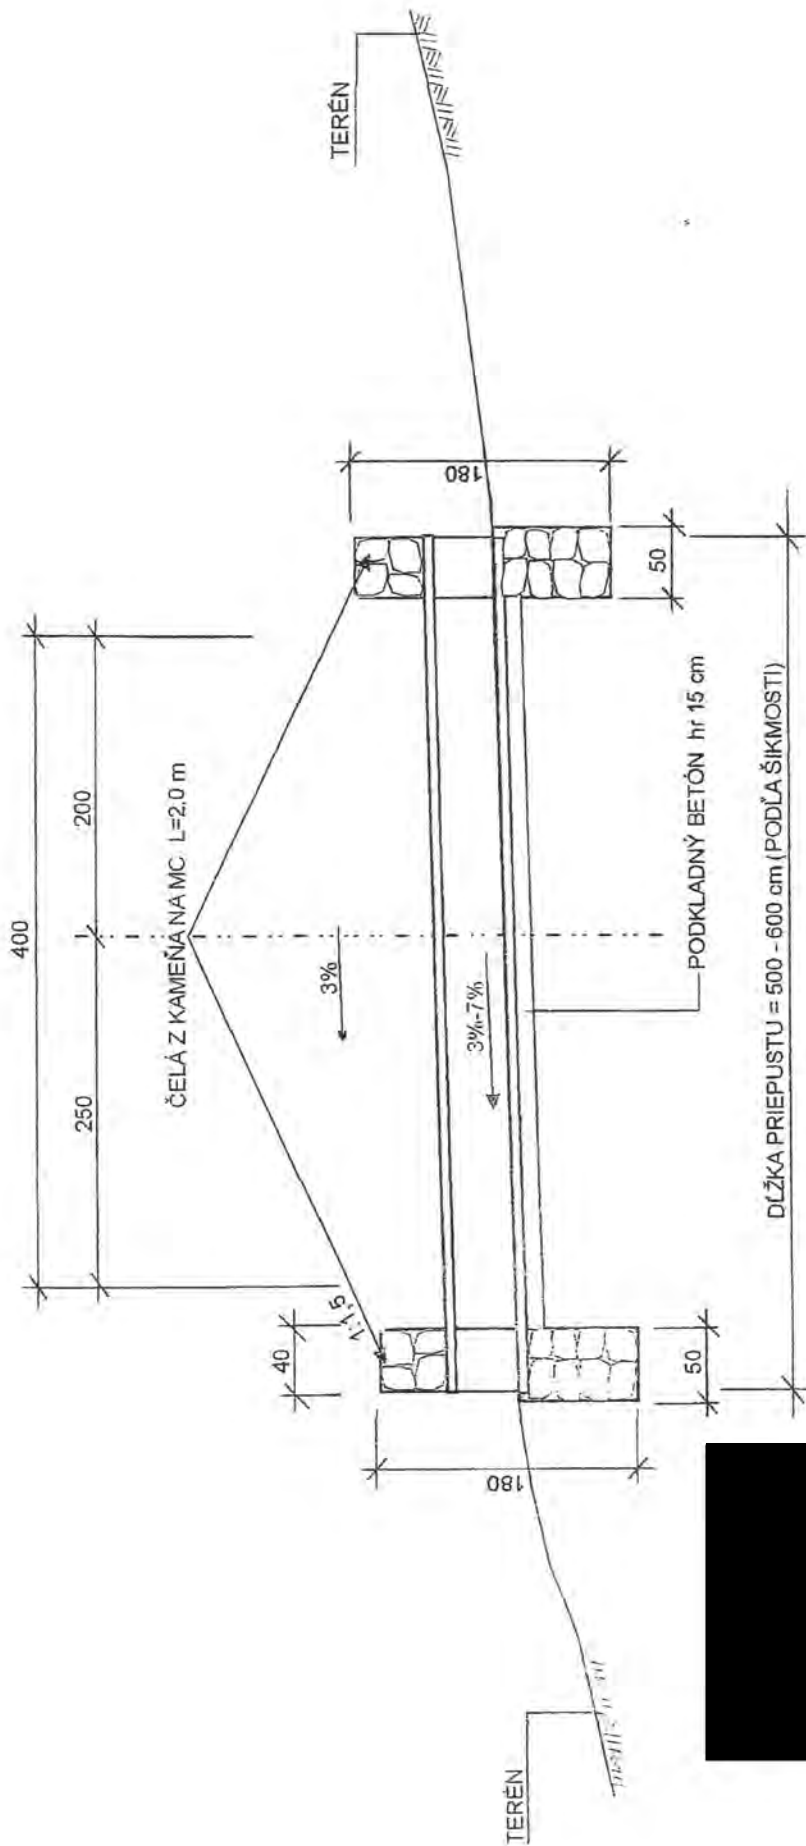

MAJO TU BOLA OVERENA AKO
08.09.2019 11:12 16.09/2018
M. J. 20.5.2018



PREHL'ADNÁ SITUÁCIA REKONŠTRUKCIE

mesta Kežmarok na území TANAP-u



M = 1 : 25 000

LEGENDA:

L.C. KEŽMARSKÉ ZLÁBY - HORARĚŇ MLYNČEKY
S OSTATNÍČENÍM V KM

L.C. TRASA
S OSTATNÍČENÍM V KM

V KOŠICIACH, FEBRUÁR 2007
VYPRACOVANÉ

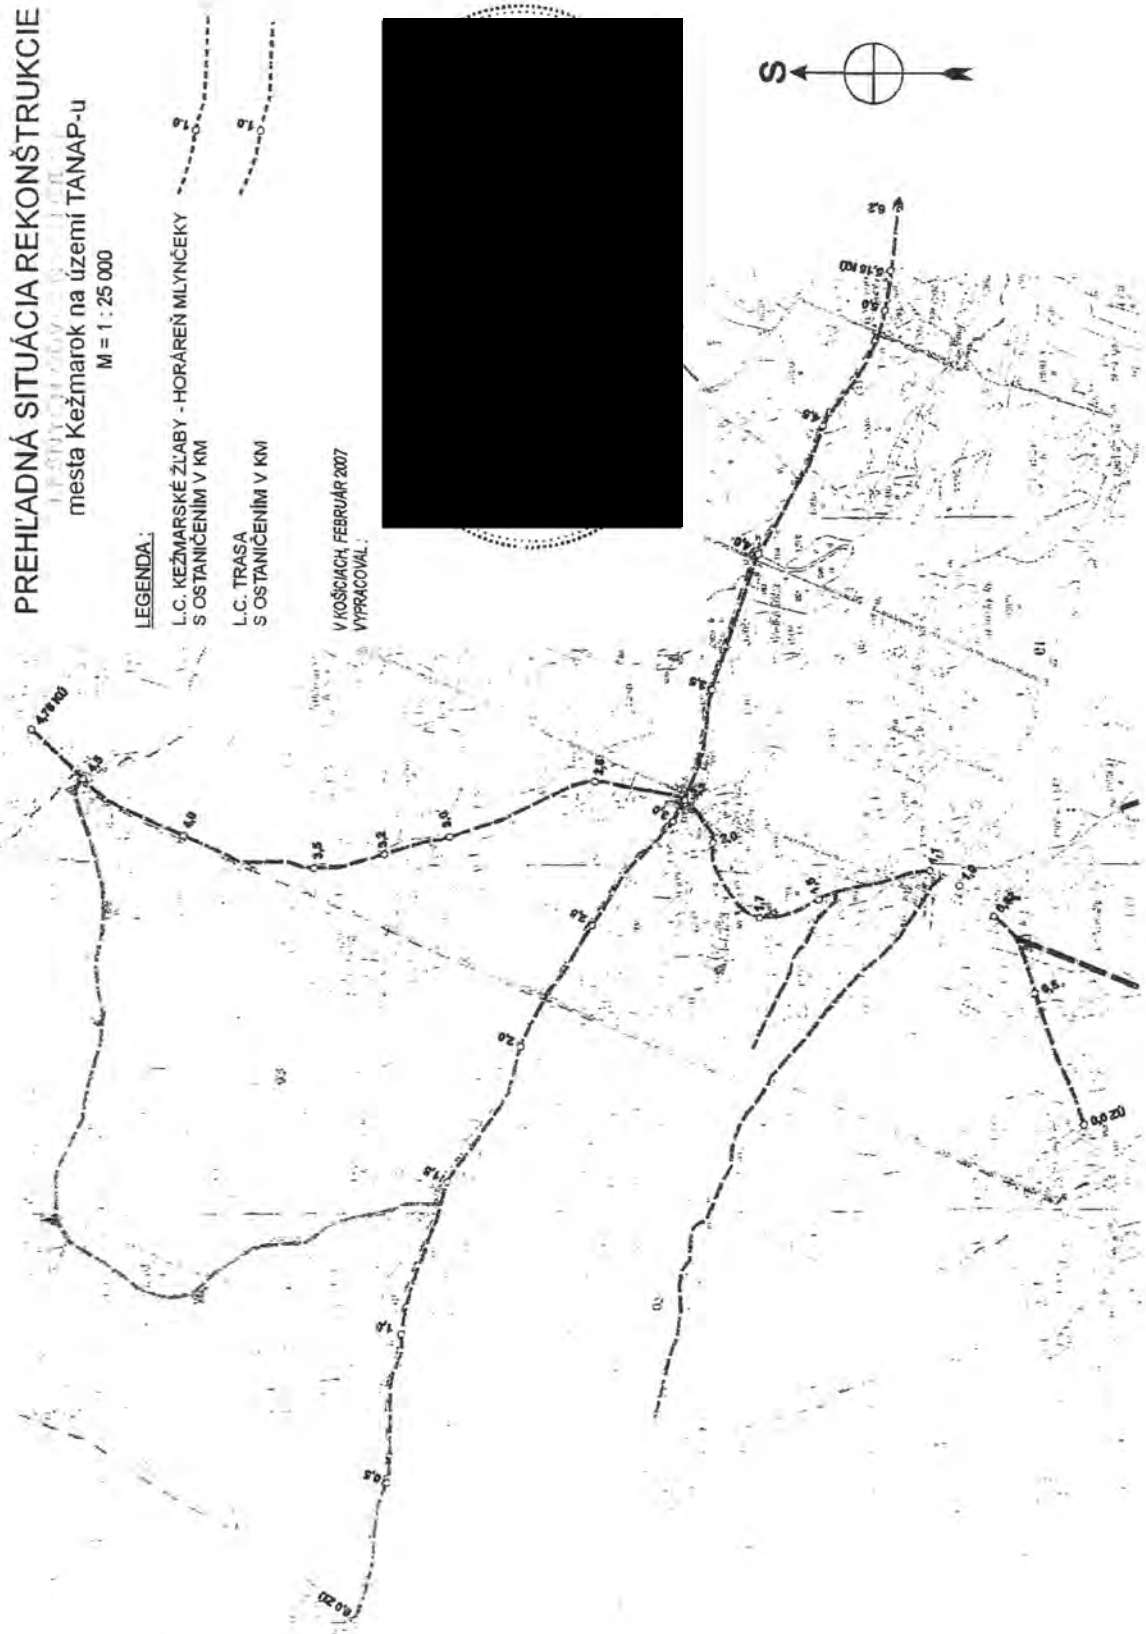


2. aug '21 9. aug '21 16. aug '21 23. aug '21 30. aug '21
2.8.138.14.8.178.88.198.170.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.8.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.6

september 2021

Protipožiarna lesná cesta TRASA - rekonštrukcia

Celková lehota výstavby v kalendárnych dňoch

id	Názov diely	Trvanie	J	Množstvo	Začiatok	Dokončenie
0						
1						
2		35 d		0	Po 2.8.21	Ne 5.9.21
3	Zemná práca	8 d	ha	0	Po 2.8.21	Str 11.8.21
4	Kosenie a ponechanie na mieste vo vegetačnom období trávneho porastu stredne hustého	2 d	ha	0,92	Po 2.8.21	Ut 3.8.21
5	Odstánenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m ²	3 d	M2	6150	Str 4.8.21	Pi 6.8.21
6	Spalenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na tvorných plochách do 100 m ²	1 d	M2	6150	Ut 10.8.21	Ut 10.8.21
7	Odkopávka a prečerpávka rozpačená pre osteny, v hĺbke 4 do 100 m ³	1 d	M3	61,25	Po 2.8.21	Po 2.8.21
8	Výkop vodotoku do 3 m hĺbky, 4 do 1000 m ³	2 d	M3	365	Ut 3.8.21	Str 4.8.21
9	Búenie konštrukcií z prostého betónu ohradeného kameňom vo výkopách	1 d	M3	5,35	Št 5.8.21	Št 5.8.21
10	Hlboké výh. štíty nad 600 do 1300 mm v hornitách tr. 4 súdržných - rubným alebo pneumatickým	4 d	M3	88	Pi 6.8.21	Str 11.8.21
11	Zhrabanie pokoseného porastu na vzdialenosť do 30 m od okraja hľadiny divokého porastu	2 d	ha	0,92	Št 5.8.21	Pi 6.8.21
12	Vedrovná kontrola	5 d	M2	0	Po 23.8.21	Pi 27.8.21
13	Oprava diaľkovej z bet. dosiek na suchu, s prípadnou výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich	5 d	M2	810	Po 23.8.21	Pi 27.8.21
14	Komunikácie	20,33 d		0	Št 12.8.21	Ne 5.9.21
15	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dreveného veľ. 32-63mm(výb. štík) po zhub. hr. 100 mm	3 d	M2	320	Št 12.8.21	Po 16.8.21
16	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dreveného veľ. 32-63mm(výb. štík) po zhub. hr. 150 mm	1 d	M2	50	Ut 17.8.21	Ut 17.8.21
17	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dreveného veľ. 30-63mm(výb. štík) po zhub. hr. 250 mm	3 d	M2	415	Str 18.8.21	Pi 20.8.21
18	Spojenie krajín, komun. pre peších a rozpr. a zhadz. štík, alebo kamen. tabuľovým hr. 100 m	1 d	M2	4620	So 4.9.21	Ne 5.9.21
19	Postrek asfaltový spojovací bez postupu kameňom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,7	0,5 d	M2	15665	Po 23.8.21	Po 23.8.21
20	Postrek asfaltový otvorený z kameňa dreveného obaleného asfaltom so zhubením hr. 60 mm	1 d	M2	15665	Po 30.8.21	Po 30.8.21
21	Kobercový asfaltový otvorený z kameňa dreveného obaleného asfaltom so zhubením hr. 60 mm	4,5 d	M2	15665	Po 23.8.21	Pi 27.8.21
22	Asfaltový vrchný vrstvou obutá AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhubení hr. 50 mm	4 d	M2	15665	Po 30.8.21	Št 2.9.21
23	Ostatné konštrukcie a práce	23 d		0	Po 9.8.21	Ne 5.9.21
24	Čelo prípestu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500	10 d	ks	5	Pi 13.8.21	Str 25.8.21
25	Čelo prípestu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800	6 d	ks	2	Str 25.8.21	Št 2.9.21
26	Hespodnsky prejazd dĺžky 3-4 m z rúr bet. do DN 500 mm. Čelo z kam muriva prevyšujúce do 600	15 d	ks	4	Po 9.8.21	Št 26.8.21
27	Vykovná nádržka z muriva z lomového kameňa na maľu cementovú, prípestu z rúr do DN 800	2 d	ks	1	Pi 3.9.21	Ne 5.9.21
28	Zhotovenie prípestu z rúr železobetónových DN 600	2 d	m	7	Po 30.8.21	Ut 31.8.21
29	Odstánenie bleša, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asf.	3 d	M2	15200	Str 1.9.21	Pi 3.9.21
30	Čistenie príkopu spenených rúrok pri šírke dna nad 400 mm a objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m ³	2 d	m	540	Pi 13.8.21	Po 16.8.21
31	Čistenie príkopu komunikácií strojne príkopovým výpomocou e objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m ³	2 d	m	7390	Ut 17.8.21	Str 18.8.21
32	Očistenie náosu na krajniciach prílep. hr. nad 50 do 100 mm, -0,125000	2 d	M2	4620	Št 19.8.21	Pi 20.8.21
33	Odkoz súlny a výbúrnych hmot na skládajú do 1 km	2 d	t	41,09	Po 23.8.21	Ut 24.8.21
34	Odkoz súlny a výbúrnych hmot na skládajú za každý ďalší 1 km	2 d	t	698,46	Po 23.8.21	Ut 24.8.21
35	Prerušenie pri pozemnej komunikácii a letisko s krytým asfaltovým akčiovým dĺžky objektu	20 d	t	5690,65	Po 9.8.21	Št 2.9.21
36	Konštrukcie doplnkové kovové	11,44 d		0	Po 23.8.21	Ne 5.9.21
37	Montáž zbraňová roňového z rúrok, s hmotnosťou 1 metra zbraňová do 45 kg	4 d	m	28	Str 25.8.21	Po 30.8.21
38	Opravy ostatných doplnkových stavieb výmena čtok zbraňová oceľových privarených, -0,00100t	2 d	m	30	Št 31.8.21	Str 1.9.21
39	Opravy ostatných doplnkových stavieb výmena výmena stojok, -0,00100t	2 d	m	20	Št 2.9.21	Pi 3.9.21
40	Demonitáž zbraňová na oceľové súlny, výšky do 1 m, -0,005900t	2 d	m	30	Po 23.8.21	Ut 24.8.21
41	Ostatné opravy samostatným zariadením a nahradením prvkov	1 d	m	50	So 4.9.21	Ne 5.9.21
42	Nátery	2 d		0	Po 30.8.21	Ut 31.8.21
43	Odstánenie korôže z kovových zbraňová obrábajúca a oceľovou kľuču DN 50 do DN 100	1 d	m	190,2	Po 30.8.21	Po 30.8.21
44	Nátery kov zbraňová do DN 100 mm dvojnásobne so základným náterom - 70µm	1 d	m	218,2	Ut 31.8.21	Ut 31.8.21

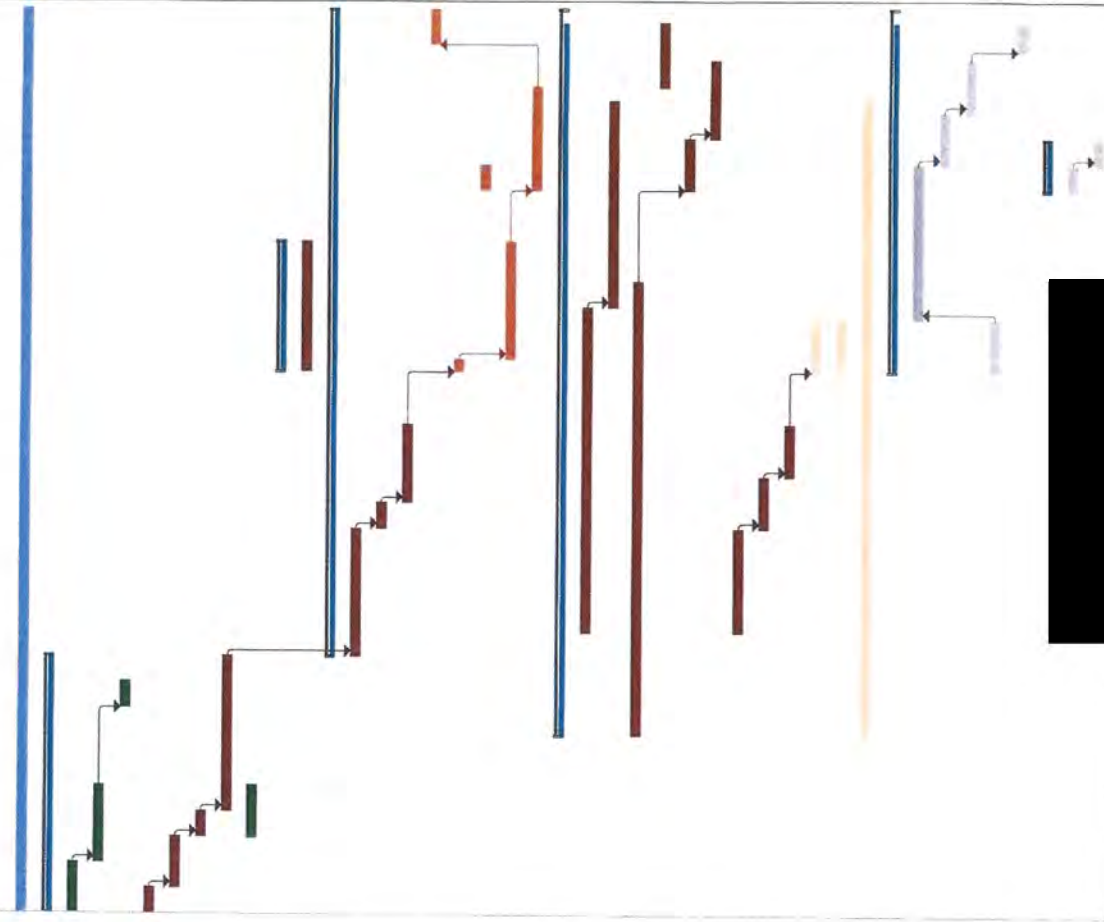

Príloha č. 4 k ZoD

Informácie o subdodávateľoch

Protipožiarna lesná cesta TRASA – rekonštrukcia

spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu

Názov a sídlo Subdodávateľa IČO	Predmet subdodávky, t.j. popis prác časti predmetu zákazky realizovaných subdodávateľom	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky (v %)	Suma, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača (v € vrátane DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa *) <i>Poznámka</i>
TRADETECH, s.r.o. Sídlo: Stará Prešovská 10, Košice IČO: 36 179 418	Zábradlie	5,27%	16.098,00 EUR	Ing. Silvia Lubyová, Konvalinková 10, 044 20 Malá Ida, Dátum narodenia: 31.8.1963
Ing. Rastislav Feriančík - zahradníctvo SADEX, Sídlo: Duklianska 19/B, 080 01 Prešov IČO ŽR: 31 249 841	Sadové úpravy	1,87%	5.703,12 EUR	Ing. Rastislav Feriančík, Surdok 24, 080 01 Prešov, Dátum narodenia: 06.04.1962
Spolu :		7,14 %	21.801,12 €	X

Ing. Martin Papala, člen predstavenstva, COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Ján [redacted] ěkuš, člen predstavenstva, COLAS Slovakia, a.s.



Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

**Poist'ovateľ
Insurer**

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.
1325/B*

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín
poistovní vedenom IVASS.

*Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers
controlled by IVASS.*

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 12.01.2021 uzavrel poistnú zmluvu č. 2407247887 v
rozsahu:

Insurer hereby confirms that on 12.01.2021 issuing a policy No. 2407247887 as follows:

**Poistník/Poistený
č. 1**

**Policy holder
/Insured no. 01**

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / ID: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V
Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No. 240/V

**Poistený č. 02
Insured no. 02**

IS-LOM s.r.o., Maglovec

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / *Slovak Republic*
IČO / ID: 31 720 803

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 14914/V
*Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No.
14914/V*

**Predmet poistenia,
Poistná suma
Subject of
Insurance,
Sum insured**

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe
v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná
zodpovednosť“) vrátane:

*The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person
connected with Insured activities (further only „General TPL“) including:*



Predmet poistenia Insured risk	Poistná suma v EUR Sum insured in EUR	Limit plnenia v EUR * Limit of indemnity in EUR *	Spoluúčasť v EUR Deductible in EUR	Územný rozsah Territory scope
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	celý svet mimo USA a Kanady <i>world- wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>			10 000,00	
Užívané veci <i>Used objects - Tenant's liability</i>			10 000,00	
Prevzaté veci <i>care, custody and control</i>			10 000,00	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>			10 000,00	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>			10 000,00	
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		166 000,00	10 000,00	SR Slovakia

* limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia

* *Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occurred during policy*



period (annual aggregate)

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00 EUR.

Poistená činnosť
Insured activity

činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra
activities listed in the Extract from the Business Register

Doba trvania poistenia
Insurance Period

Od 01.01.2021, 00:00 hod. do 31.12.2021, 23:59 hod.
From 01.01.2021, 00:00 a.m. to 31.12.2021, 23:59 p.m.

Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Iard, Francúzsko.

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali Iard, France.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 01.02.2021

In Bratislava, on 01-st of February 2021

Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK20216034-
035

.....
Generali Poist'ovňa, a. s.
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programu poistenia
Underwriter

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Willis (Slovakia) org. Zložka

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 00421 2 5263 5062-3

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: martin.zumerling@willistowerswatson.com



POTVRDENIE O POISTENÍ

Potvrdzujeme, že Generali Poistovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 709 332 (ďalej len „poisťovateľ“) uzatvorila stavebné poistenie pre spoločnosť Inžinierske stavby, a. s.:

Poistná zmluva č. 2401719232

Poistník / Poistený: COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika
IČO: 31 651 402, IČ DPH: SK2020492111
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 14485/1

Druh poistenia: Stavebné poistenie (rámcová zmluva)
Rozsah poistenia: Poistenie stavebných (montážnych) prác
Poistná suma: 2.000.000 EUR - poistná suma 1 diela
Územná platnosť: Slovenská republika
Poistné obdobie: od 1.1.2020 na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok
Predmet poistenia: Realizované stavebné diela
Spoluúčasť: 3.000 EUR Pre stavebnú (montážnu) činnosť
Úhrada poistného: do 1.1.2022 je uhradené

Potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Prešove, 04.03.2021

Ing. Martin Fedo
underwriter

La
IČO
